

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 05/02/2025

Inspecteur: Bram Van Nuffel

Mentor:

Installateur: Green-Tec bv

ID-label: Ledebaan 114

B.T.W. nr.: BE 0785 792 743

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481267

Datum verslag: 05/02/2025

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1814808

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Ledebaan
Huisnummer 114
Busnummer
Postcode 9300
Gemeente AALST
Land België

Eigenaar

Naam Innido
Straatnaam Ledebaan
Huisnummer 114
Busnummer
Postcode 9300
Gemeente AALST
Land België

Installateur

Naam Green-Tec bv
BTW nr. BE 0785 792 743
Telefoonnummer +32 474 38 46 14
E-mail info@elektriciteitswerkendc.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820062639031

Teller Nr.: : 1LGZ0470511914



Aard onderzoek:

Wijziging of uitbreiding van een huishoudelijke installatie van na 1981 volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.4 en 6.4.7.3

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Ja

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1-230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 34

De installatie mag verzwaard worden naar: 40 A, 3-230V

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 8.72 MΩ

RE: 12.49 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	34	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	-	8	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	-	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 5/2/2050
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:43 tot 12:20

De inspecteur Bram Van Nuffel

ACEG VZW - #128

De werknemer,

Bram Van Nuffel

Bram Van Nuffel


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 5/2/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



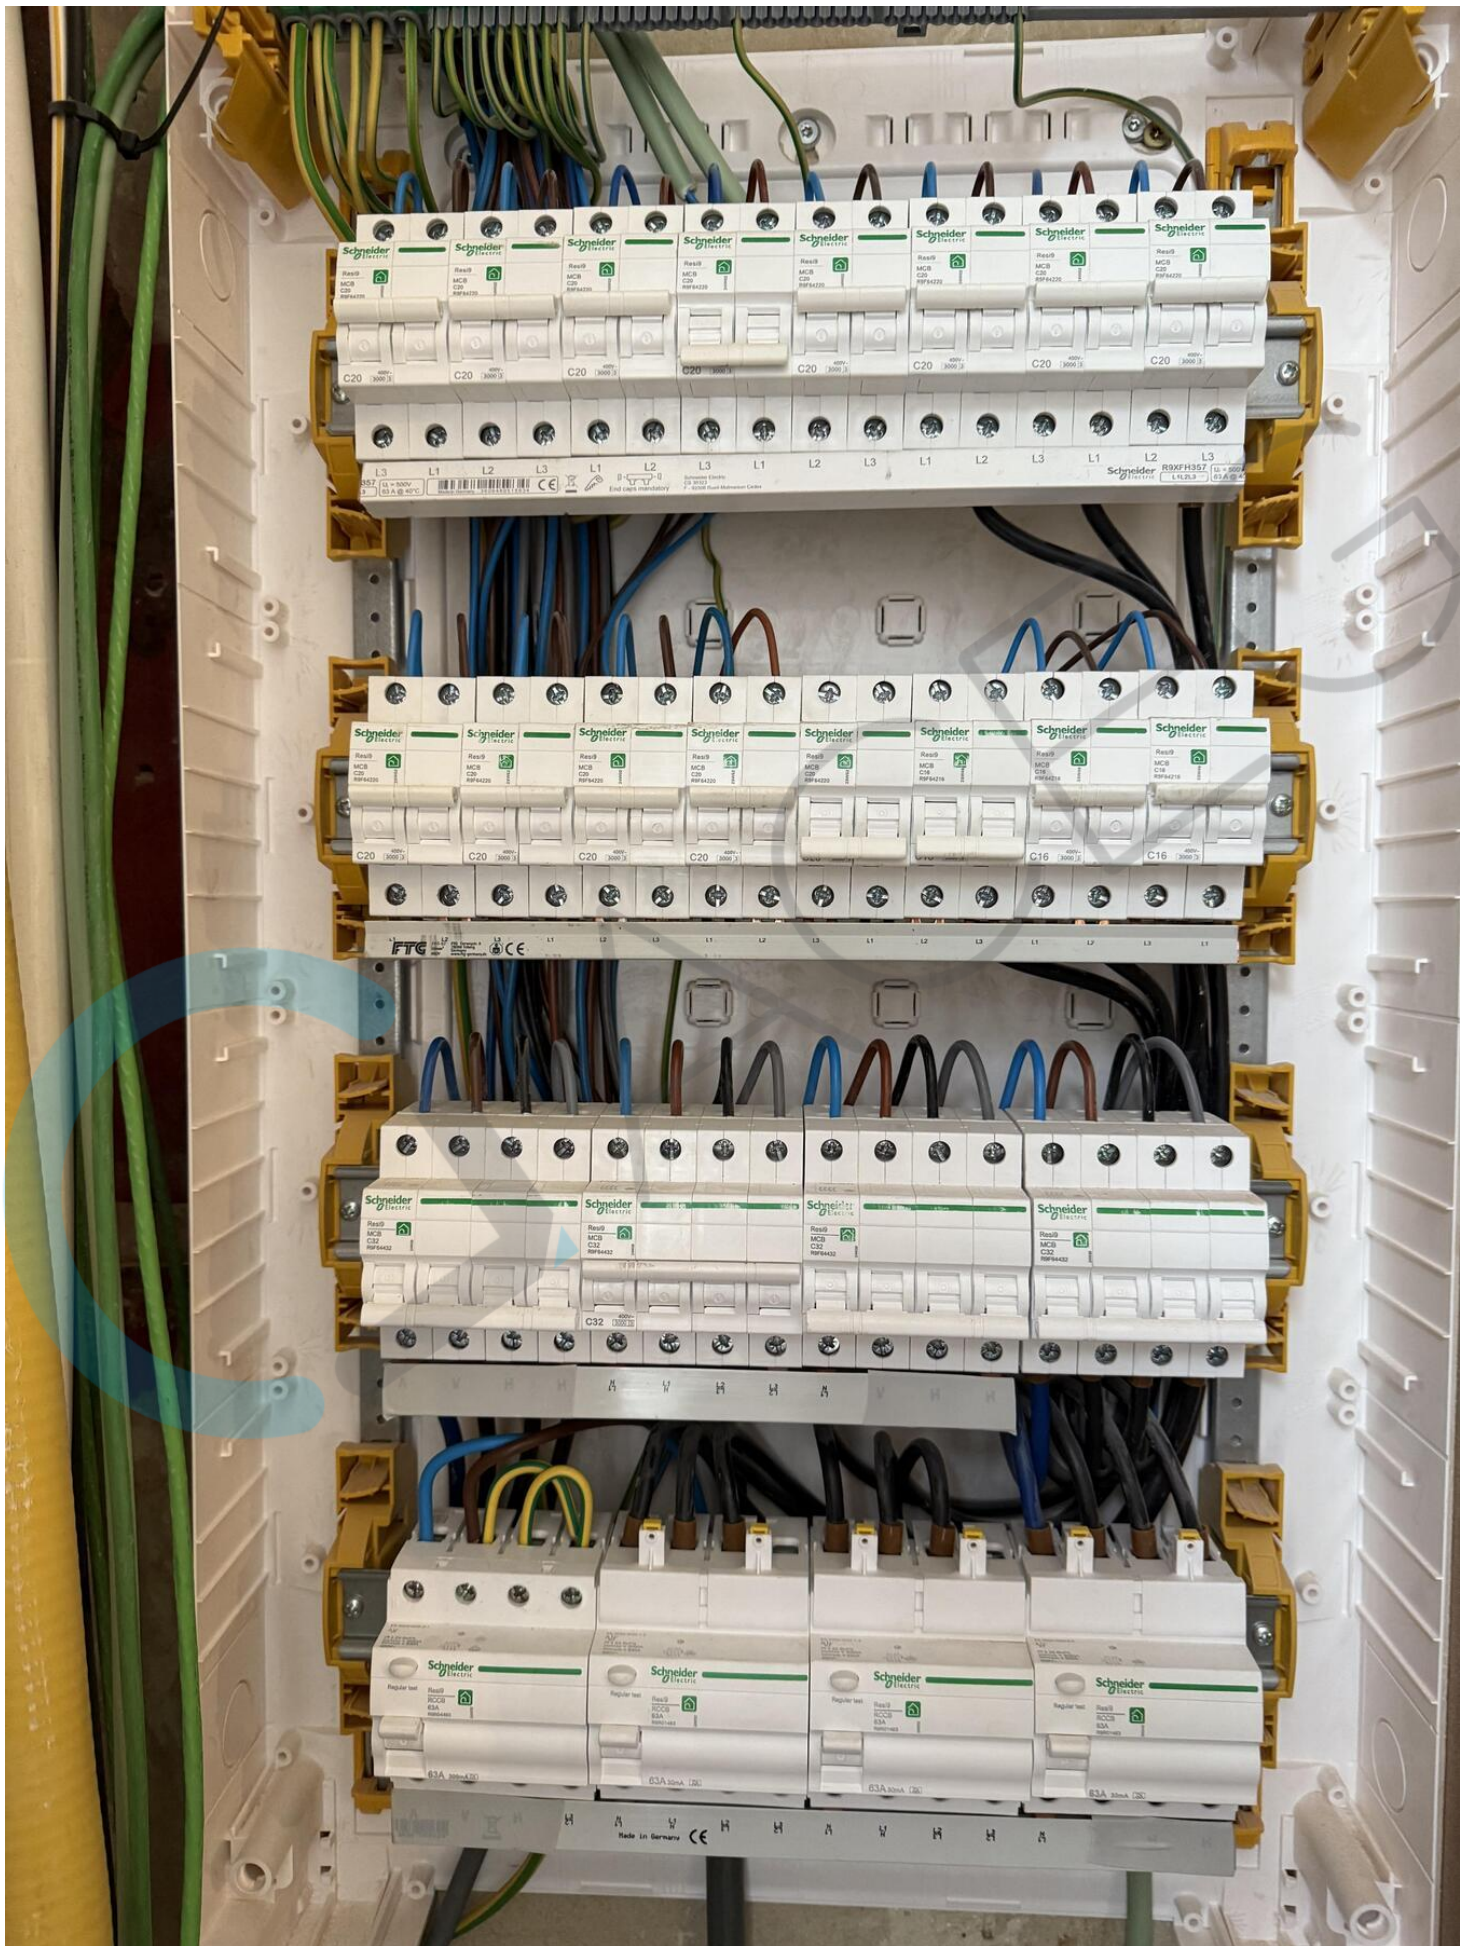












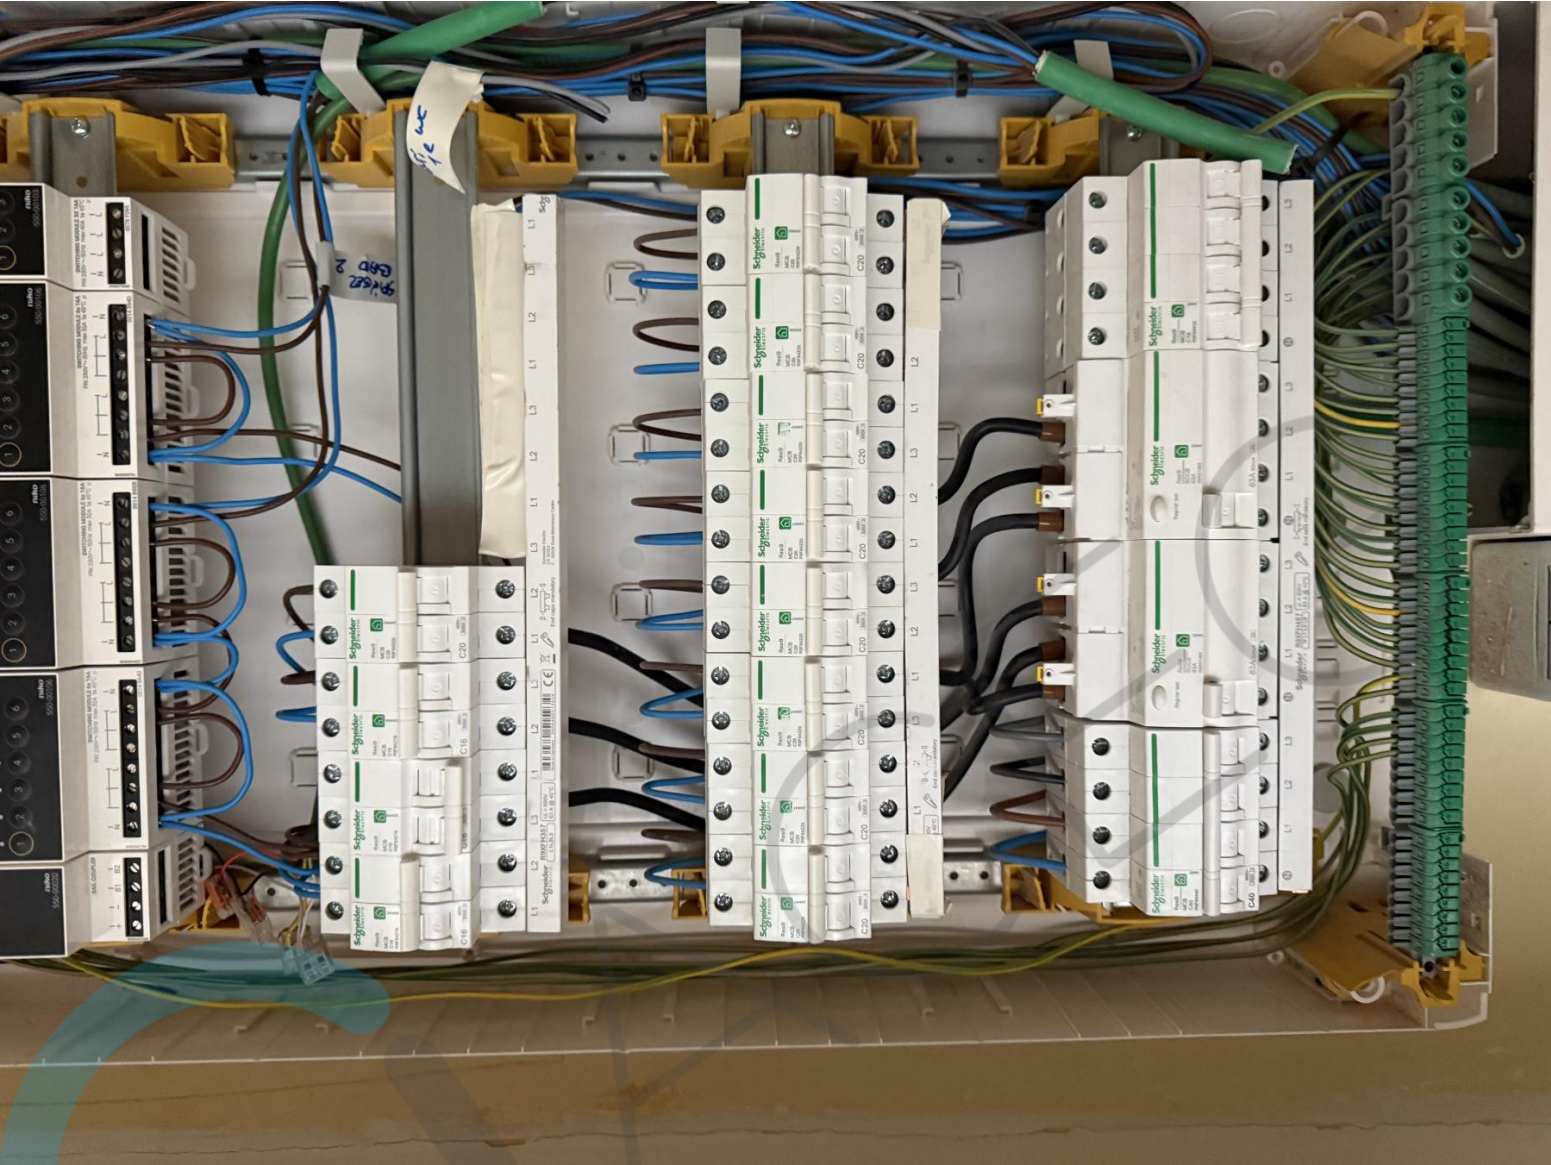

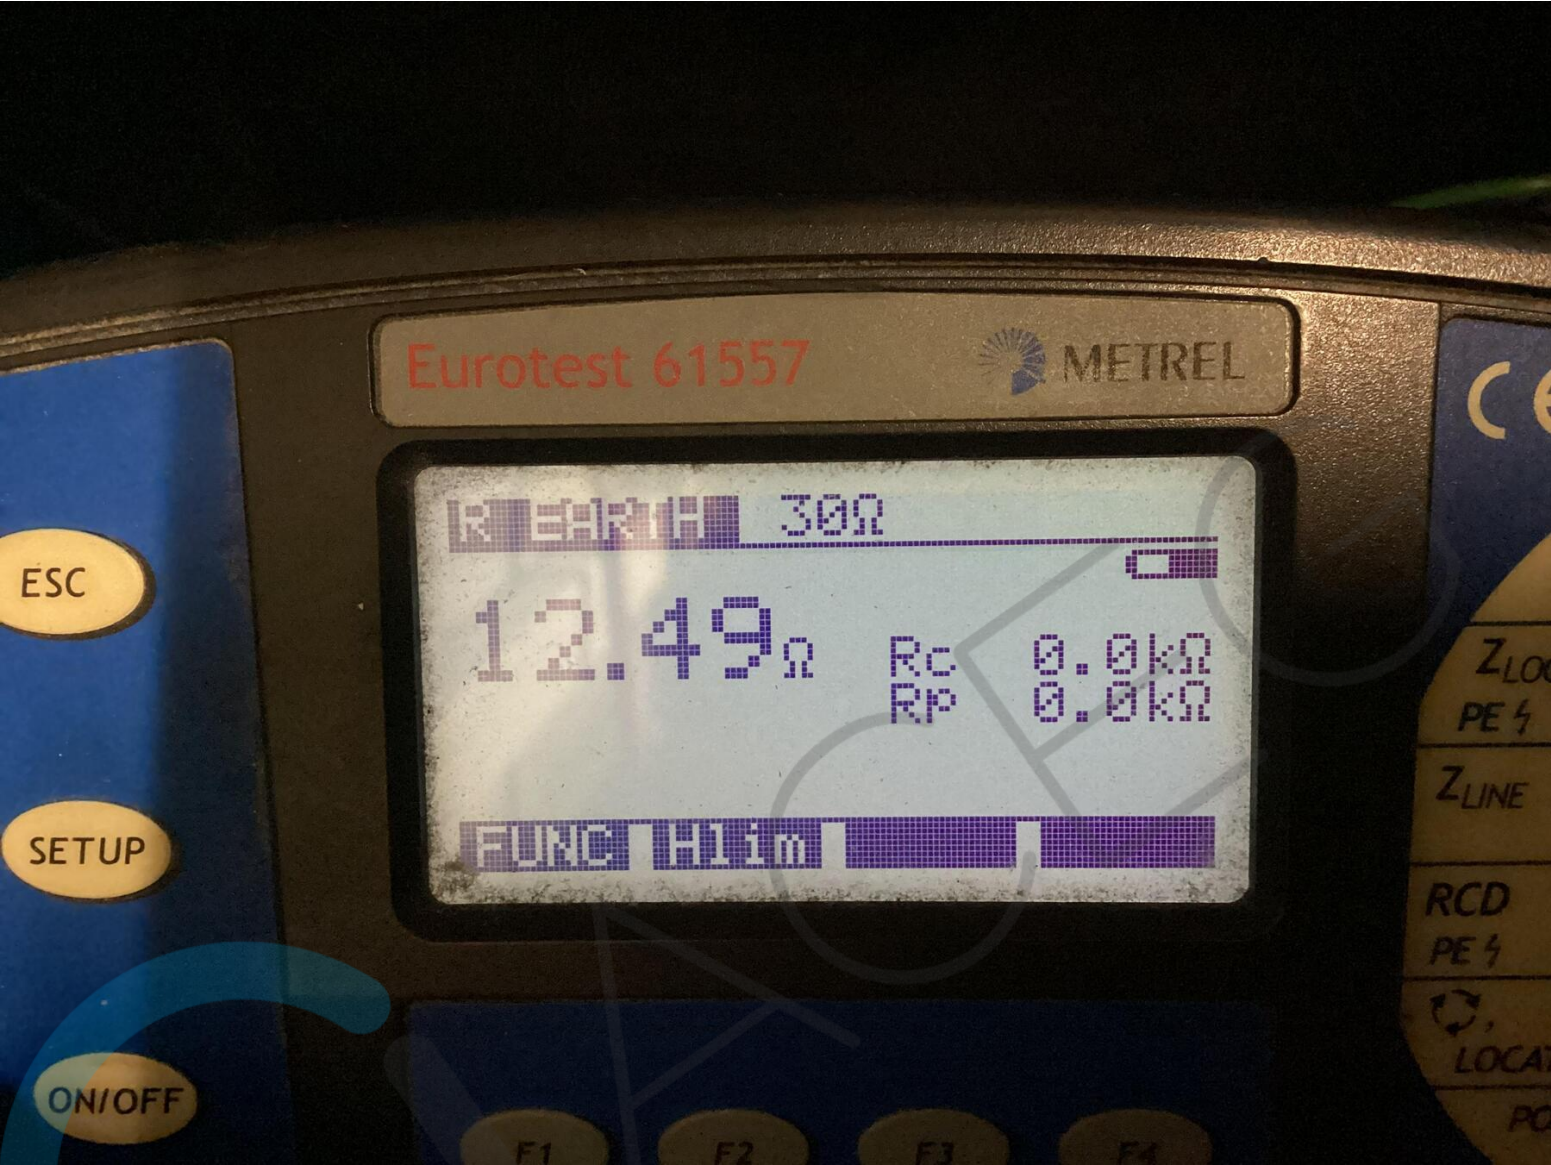



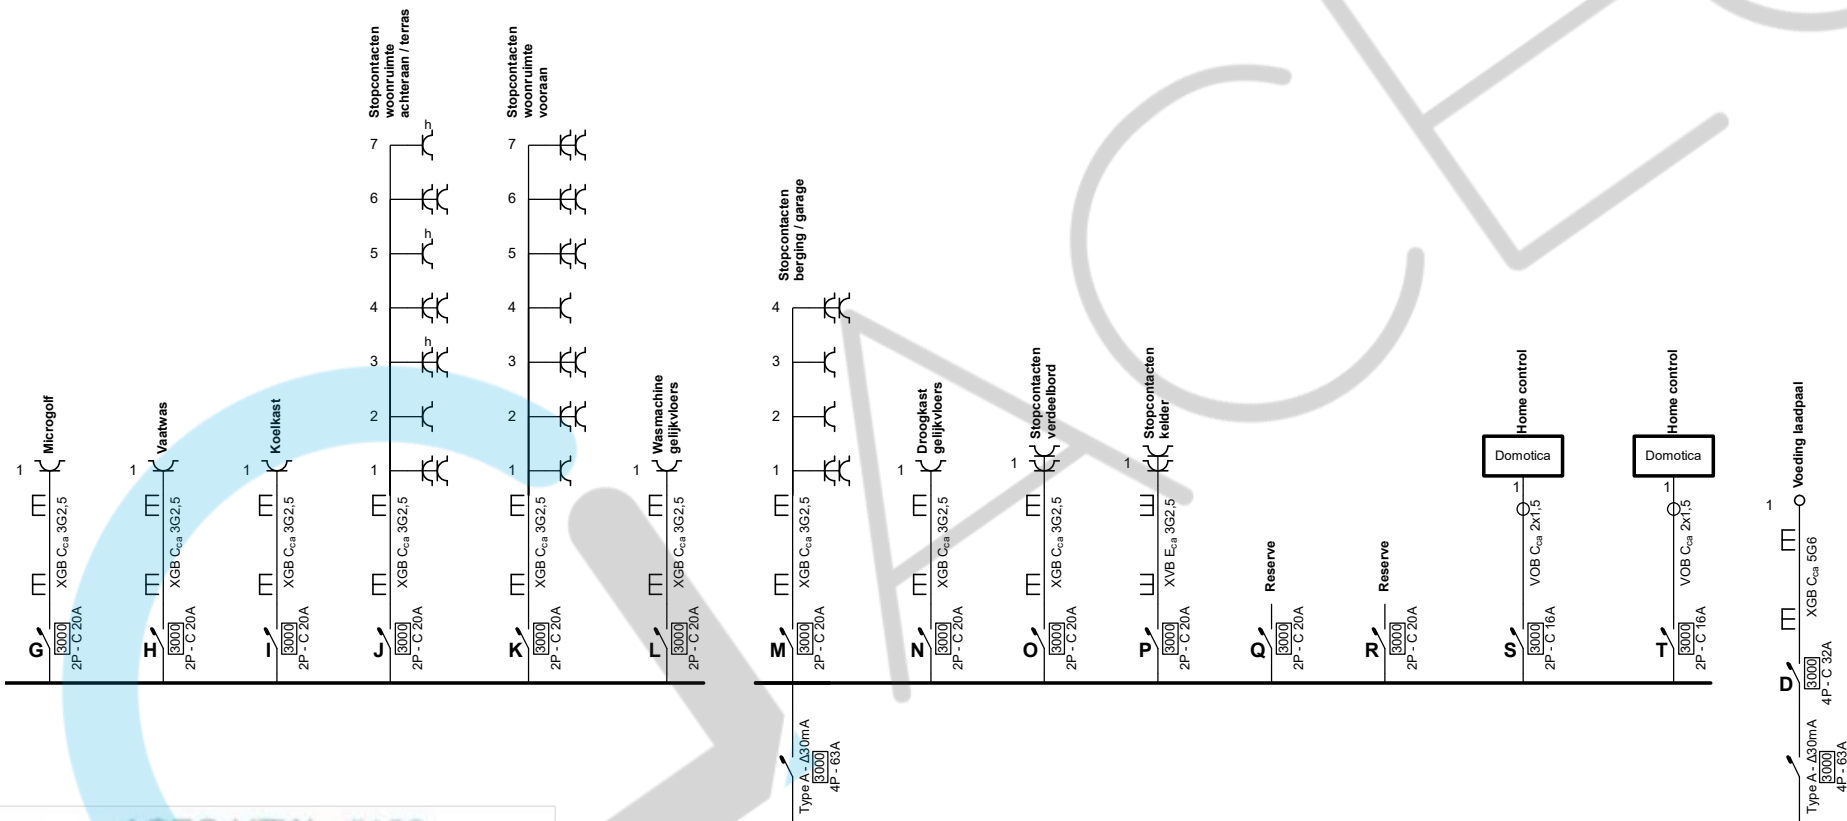

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Beyer
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

05/02/2025

Plaats van de elektrische installatie
Innido
Ledebaan 114
9300 Aalst

Installateur
Elektriciteitswerken De Cock bv
Kloosterstraat 12
9340 Lede
GSM: 0474 38 46 14
e-mail: info@elektriciteitswerkendc.be
BE 0785.792.743



De Cock w.

p. 2/7
Eendraadschema


Datum: 5/02/2025

3 x 230V ~ 50Hz

Woonruimte achteraan

Keuken

Woonruimte vooraan

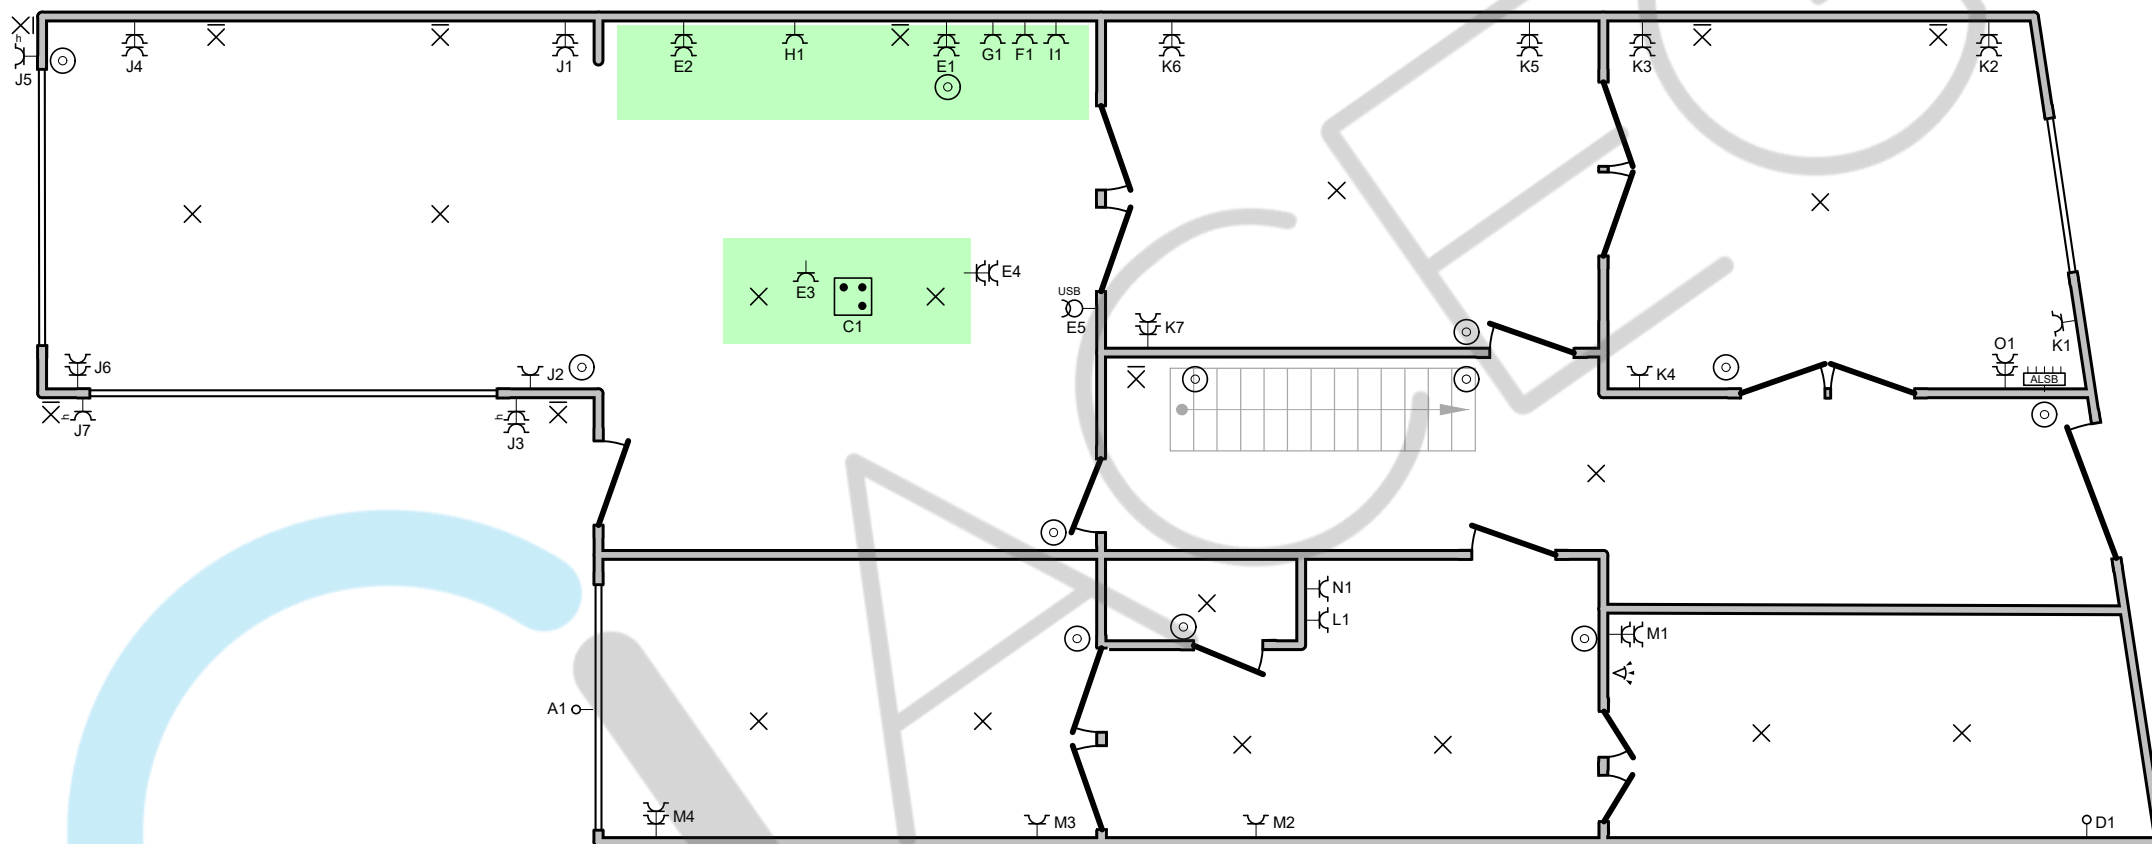

Berging

Garage

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

05/02/2025

Plaats van de elektrische installatie
Innido
Ledebaan 114
9300 Aalst

Installateur
Elektriciteitswerken De Cock bv
Kloosterstraat 12
9340 Lede
GSM: 0474 38 46 14
e-mail: info@elektriciteitswerkendc.be
BE 0785.792.743



De Cock w.


p. 3/7
Situatieplan

Datum: 5/02/2025

3 x 230V ~ 50Hz

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2

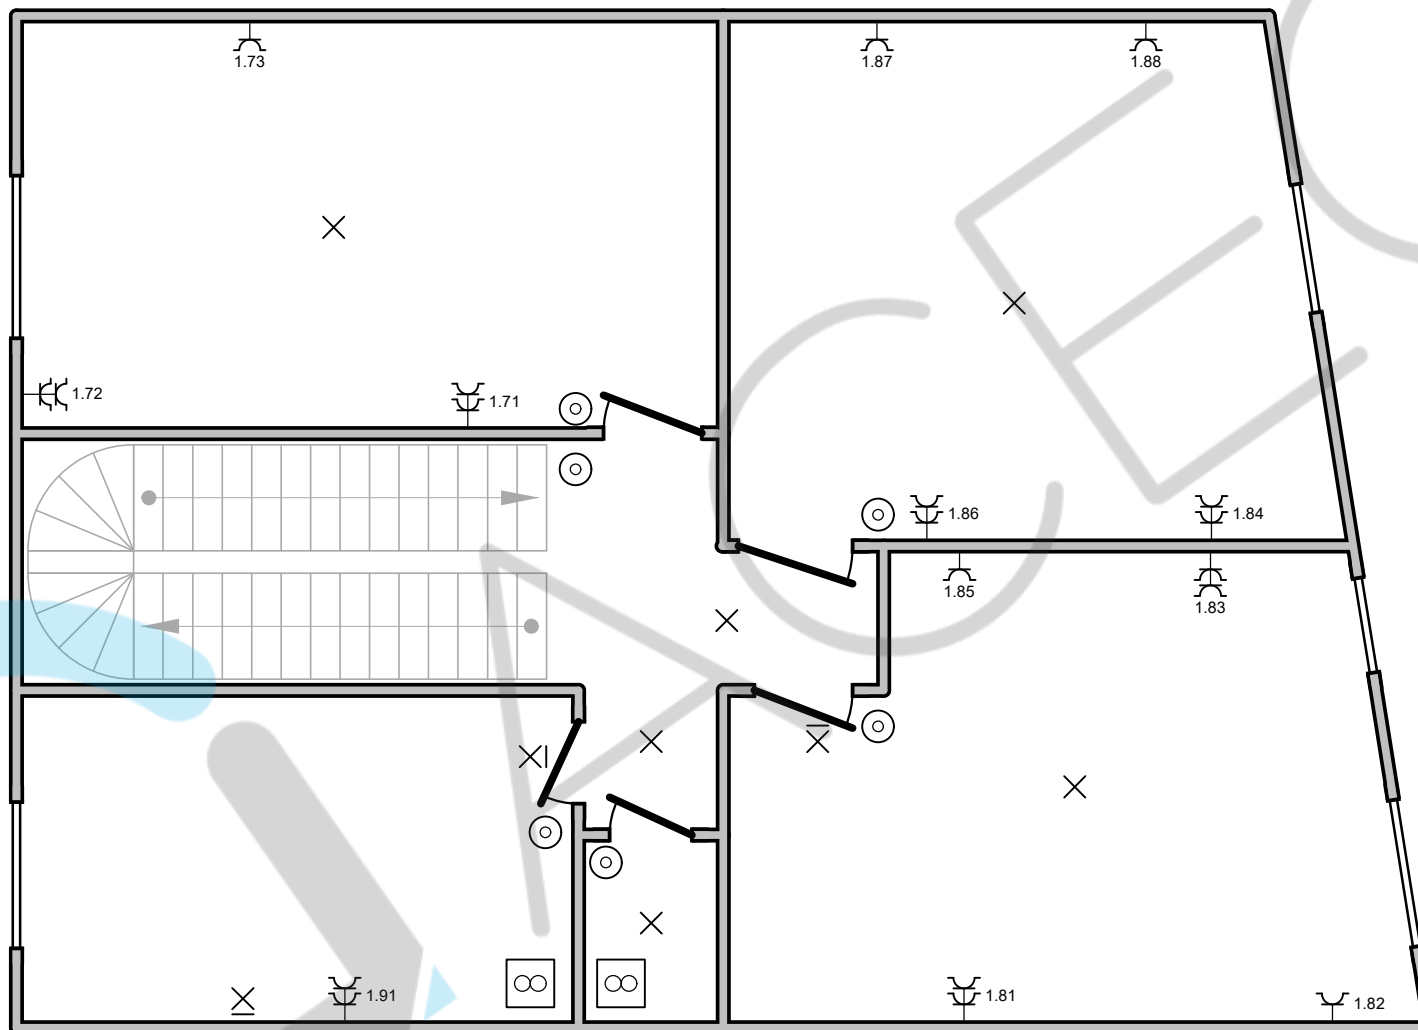

Badkamer 1

Slaapkamer 3

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

05/02/2025

Plaats van de elektrische installatie
Innido
Ledebaan 114
9300 Aalst

Installateur
Elektriciteitswerken De Cock bv
Kloosterstraat 12
9340 Lede
GSM: 0474 38 46 14
e-mail: info@elektriciteitswerkendc.be
BE 0785.792.743



De Cock w.


p. 4/7
Situatieplan

Datum: 5/02/2025

3 x 230V ~ 50Hz

Slaapkamer 4

Slaapkamer 5

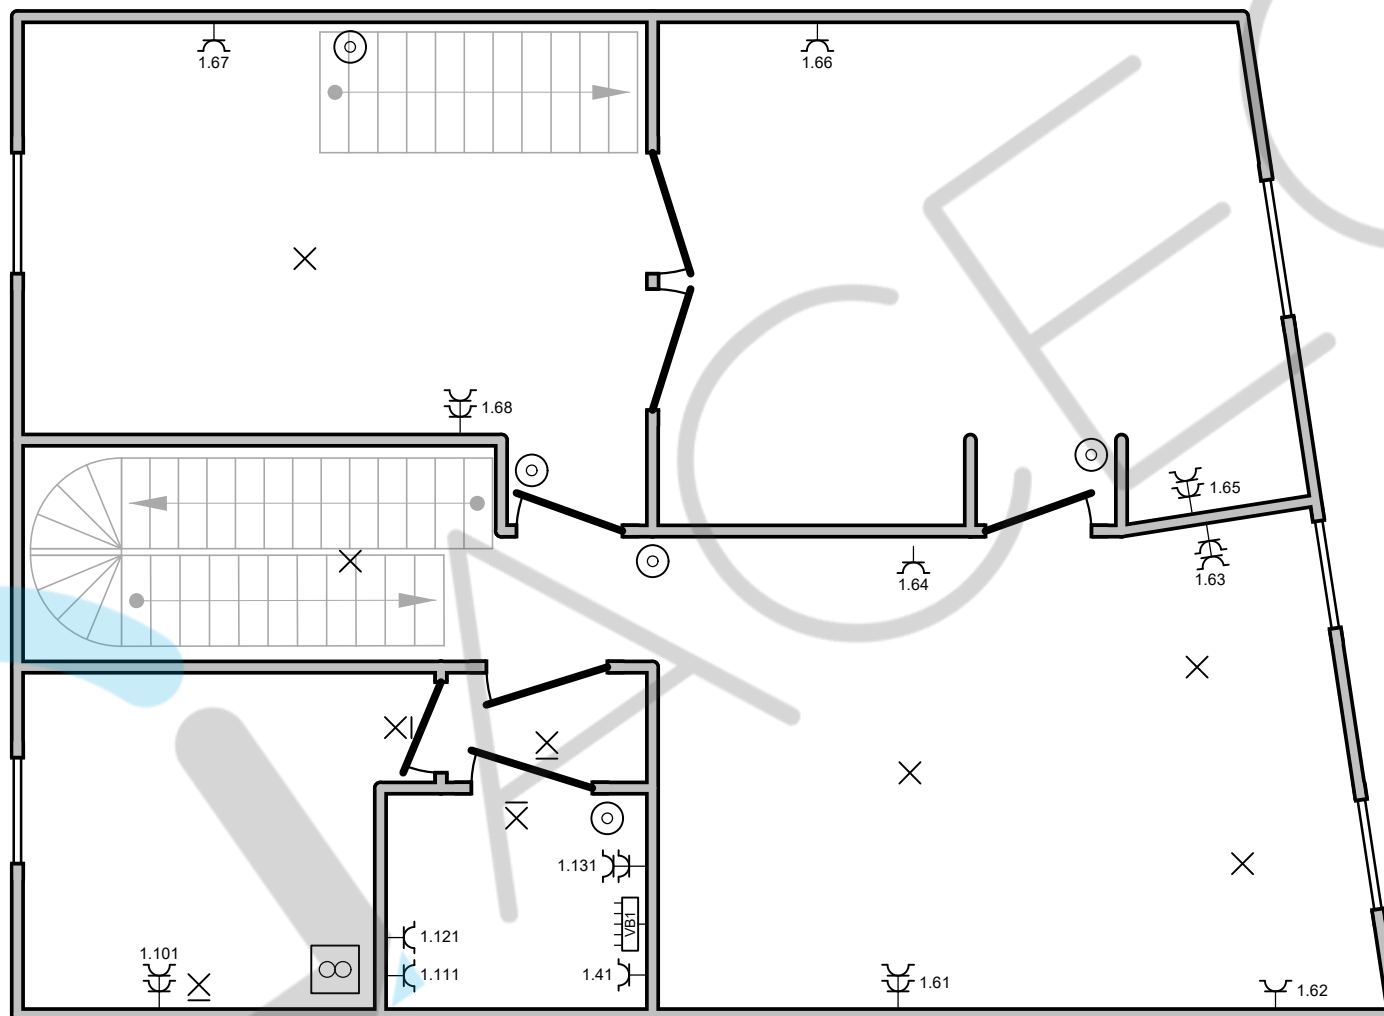

Badkamer 2

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

05/02/2025

Plaats van de elektrische installatie
Innido
Ledebaan 114
9300 Aalst

Installateur
Elektriciteitswerken De Cock bv
Kloosterstraat 12
9340 Lede
GSM: 0474 38 46 14
e-mail: info@elektriciteitswerkendc.be
BE 0785.792.743





De Cock w.

p. 5/7
Situatieplan

Datum: 5/02/2025

3 x 230V ~ 50Hz

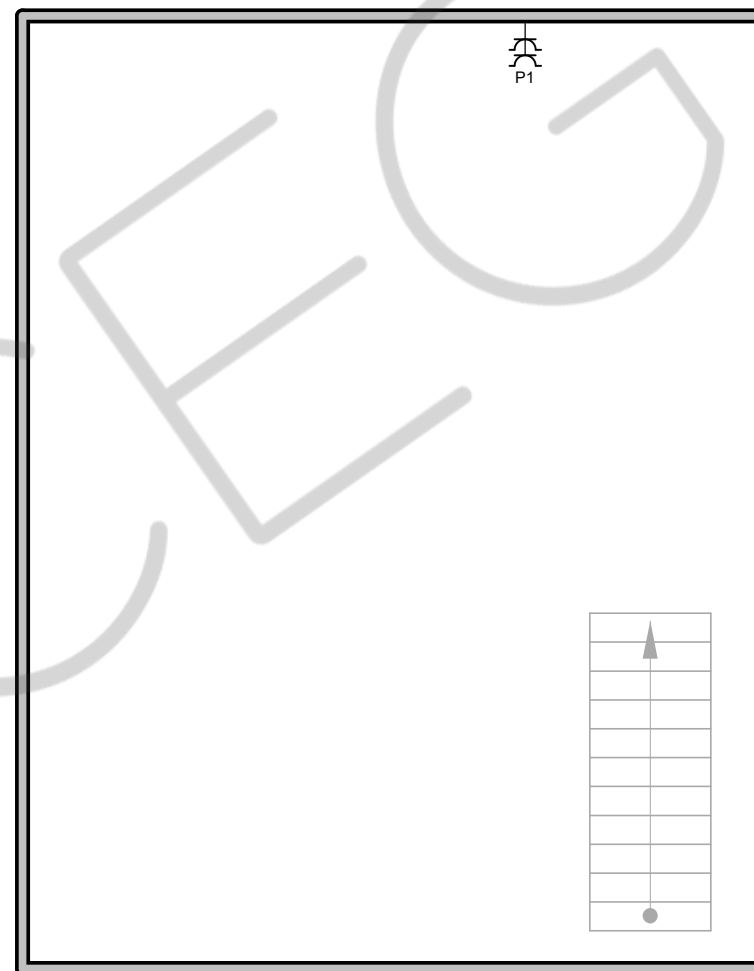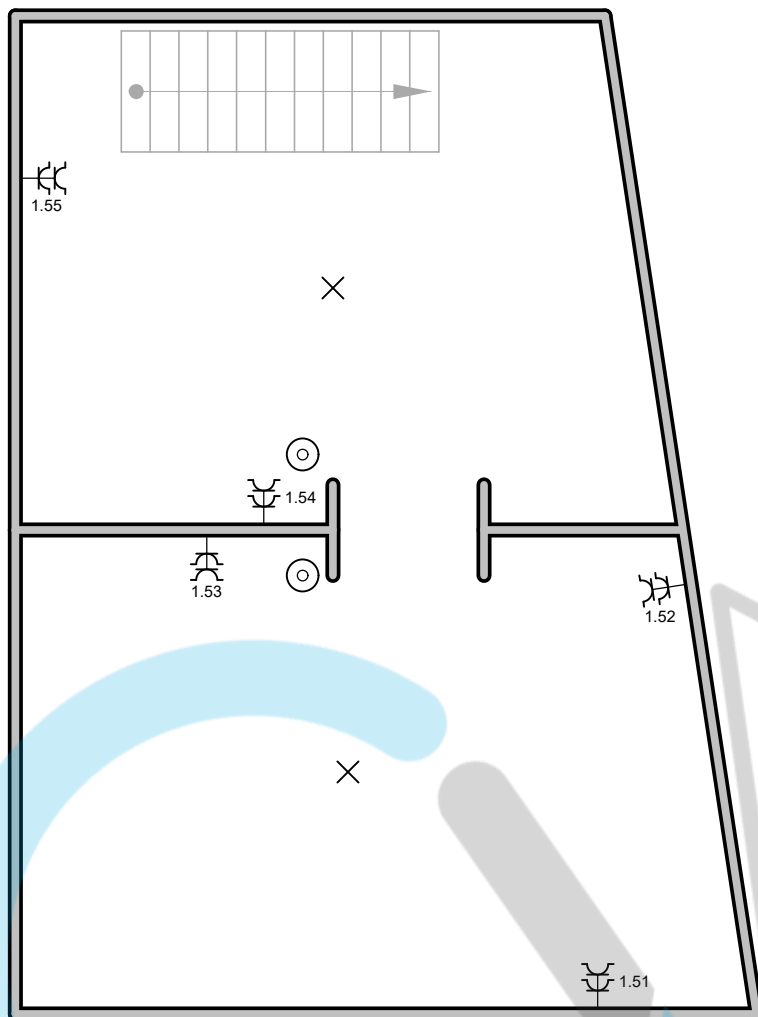

Zolder

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

05/02/2025

Plaats van de elektrische installatie
Innido
Ledebaan 114
9300 Aalst

Installateur
Elektriciteitswerken De Cock bv
Kloosterstraat 12
9340 Lede
GSM: 0474 38 46 14
e-mail: info@elektriciteitswerkendc.be
BE 0785.792.743



De Cock w.

p. 6/7
Situatieplan

Datum: 5/02/2025

3 x 230V ~ 50Hz

A	Voeding tuin
B	Verdeelbord 1
1.2	Home control
1.3	Home control
1.4	CV ketel
1.5	Stopcontacten zolder
1.6	Stopcontacten tweede verdiep
1.7	Stopcontacten slaapkamer 1
1.8	Stopcontacten slaapkamer 2 + 3
1.9	Stopcontacten badkamer 1
1.10	Stopcontacten badkamer 2
1.11	Wasmachine tweede verdiep
1.12	Droogkast tweede verdiep
1.13	Stopcontacten verdeelbord
1.1	Reserve
C	Kookplaat
E	Stopcontacten keuken
F	Oven
G	Microgolf
H	Vaatwas
I	Koelkast
J	Stopcontacten woonruimte achteraan / terras

K	Stopcontacten woonruimte vooraan
L	Wasmachine gelijkvloers
M	Stopcontacten berging / garage
N	Droogkast gelijkvloers
O	Stopcontacten verdeelbord
P	Stopcontacten kelder
Q	Reserve
R	Reserve
S	Home control
T	Home control
D	Voeding laadpaal

ACEG VZW #122
De werknemer,

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

05/02/2025

Plaats van de elektrische installatie
Innido
Ledebaan 114
9300 Aalst

Installateur
Elektriciteitswerken De Cock bv
Kloosterstraat 12
9340 Lede
GSM: 0474 38 46 14
e-mail: info@elektriciteitswerkendc.be
BE 0785.792.743



De Cock w.

p. 7/7
Lijst Kringen
Datum: 5/02/2025
3 x 230V ~ 50Hz
